Id	Nome da Tarefa	Duração	Predecessoras	Margem de atraso total
0	**Reforma do Escritório**	**28 dias**		**0 dias**
1	**FORNECIMENTOS**	**15 dias**		**2 dias**
2	FORNECIMENTO DO PISO ELEVADO	10 dias		4 dias
3	FORNECIMENTO DAS DIVISÓRIAS	10 dias		13 dias
4	FORNECIMENTO DO FORRO	5 dias		2 dias
5	FORNECIMENTO DAS LUMINÁRIAS	5 dias		20 dias
6	FORNECIMENTO DO MOBILIÁRIO NC	15 dias		11 dias
7	FORNECIMENTO DA ESCADA METÁL	15 dias		11 dias
8	**REMOÇÕES**	**4 dias**		**0 dias**
9	RETIRADA DO MOBILIÁRIO EXISTEN	1 dia		0 dias
10	REMOÇÃO DIVISÓRIAS EXISTENTES	2 dias	9	0 dias
11	REMOÇÃO DO FORRO EXISTENTE	1 dia	10	0 dias
12	**FORRO**	**11 dias**		**0 dias**
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA SUPERIOR	3 dias	11	0 dias
14	INSTALAÇÃO DO NOVO FORRO	5 dias	4;13	0 dias
15	INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS	3 dias	5;14	13 dias
16	**PORTAS E PAREDES**	**12 dias**		**6 dias**
17	SUBSTITUIÇÃO DE JANELA POR POR	2 dias	11	6 dias
18	INSTALAÇÃO DA NOVA JANELA	2 dias	17	6 dias
19	PINTURA DAS PAREDES	4 dias	14	10 dias
20	PINTURA DAS ESQUADRIAS	2 dias	19II	12 dias
21	**PISOS E DIVISÓRIAS**	**14 dias**		**0 dias**
22	CABEAMENTO	4 dias	14	0 dias
23	INSTALAÇÃO DO PISO ELEVADO	6 dias	2;22II+2 dias;18	0 dias
24	REVESTIMENTO DO PISO ELEVADO	3 dias	23	0 dias
25	INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS	3 dias	3;24	0 dias
26	**ESCADA**	**2 dias**		**11 dias**
27	INSTALAÇÃO DA ESCADA	2 dias	7;17	11 dias
28	**MOBILIÁRIO**	**2 dias**		**0 dias**
29	INSTALAÇÃO DO MOBILIÁRIO NOVO	2 dias	6;25;19;20	0 dias
30	RECOLOCAÇÃO DO MOBILIÁRIO AN	1 dia	29II	1 dia

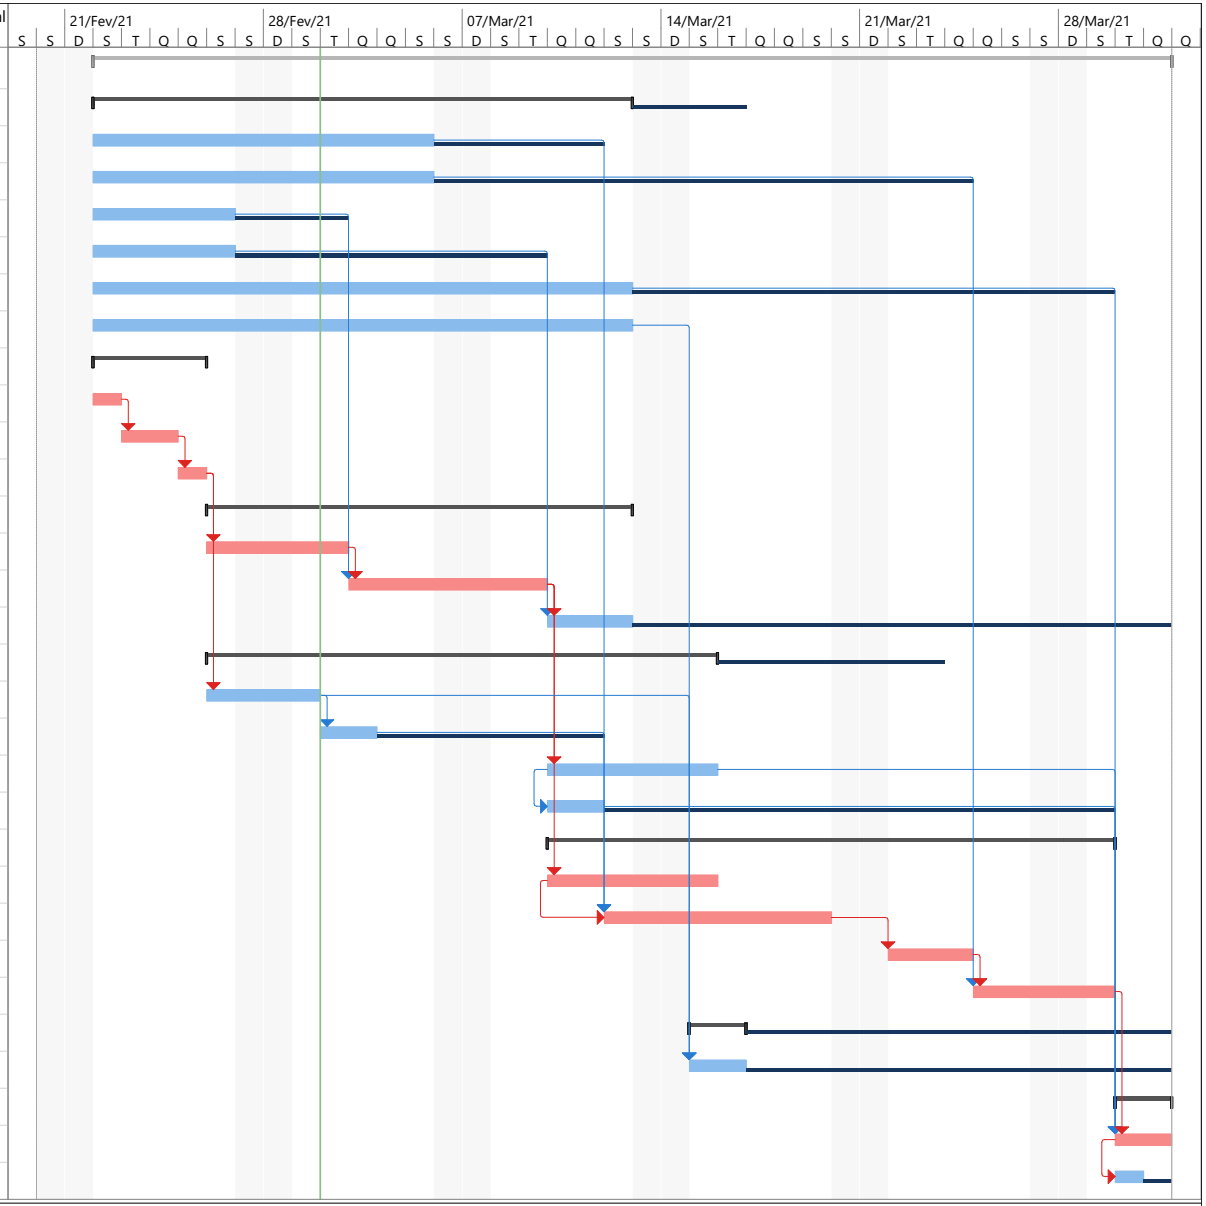

Projeto: Reforma do Escritório
Data: Ter 02/03/21

Tarefa	Tarefa Inativa	Acúmulo de Resumo Manual	Marco externo	Progresso manual
Divisão	Marco Inativo	Resumo Manual	Data limite	Margem de Atraso
Marco	Resumo Inativo	Somente início	Crítica	
Resumo	Tarefa Manual	Somente término	Divisão crítica	
Resumo do projeto	Somente duração	Tarefas externas	Andamento	
